

Tracteur 8 X 6 X 4 sans Grue	
Masse	42.04 t
Charge e1 (RS):	8.634 t
Charge e2 (RS):	7.712 t
Charge e3 (RJ):	12.847 t
Charge e4 (RJ):	12.847 t

CONVOI 20L3F MHD + 1Tracteur et 2 pousseurs + GV EPR 2 ~1670 Mw	
Masse Remorque à vide	117 760 kg
Masse transportée	580 000 kg
Poids total remorque	697 760 kg
Charge Ligne d'essieux (Kg/L.E)	34 888 kg/L.E
Charge Linéique (kg/m)	23 662 kg/m
Charge Surfacique (kg/m²)	4 859 kg/m²
POIDS TOTAL REMORQUE + 3 TRACTEURS	823 888 kg

Remorque MHD 20L3F à vide	
Masse	117 760 kg
LONGUEUR	31 m
LARGEUR	4.87 m
Charge Ligne d'essieux (kg/L.E)	5888 kg/LE
Charge Linéique (kg/m)	3993 kg/m
Charge Surfacique (kg/m²)	820 kg/m²

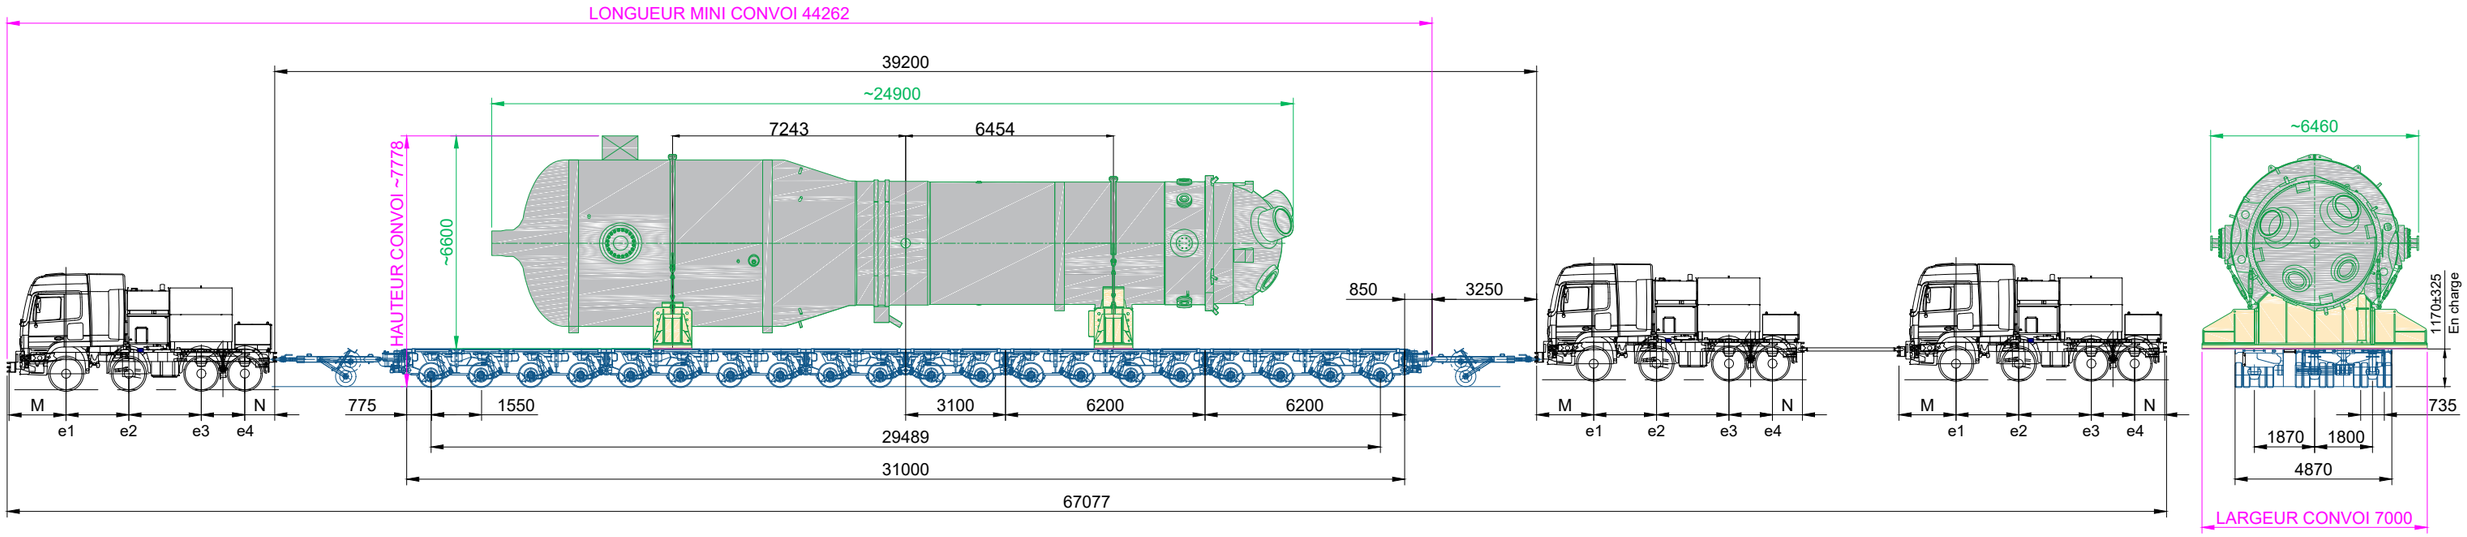

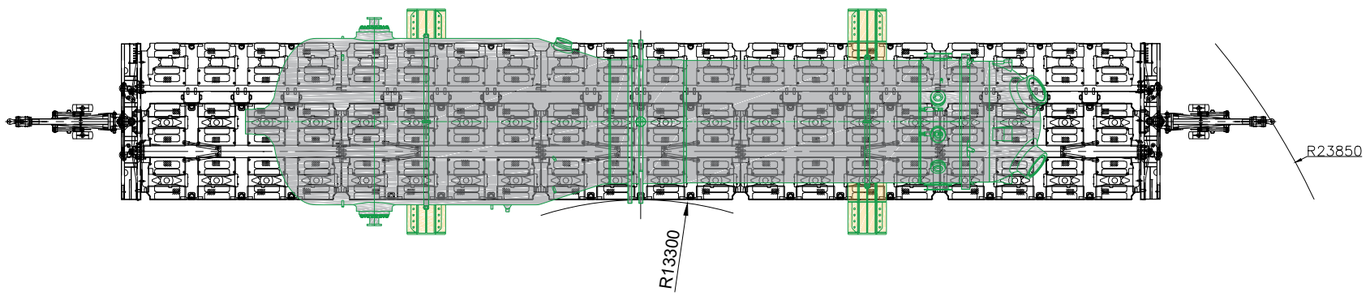

DPNT - DAIP - ULM
ALN St LEU
Zone Industrielle du Renoir
8 rue Marcel Paul
60340 St LEU d'ESSERENT


Pour plus de renseignements, veuillez contacter:


Agence Logistique Nationale
Téléphone: 03 44 29 58 00
Télécopie: 03 44 29 58 09


IND	DATE	AUTEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEUR	ETAT	MODIFICATIONS - OBSERVATIONS
01	04/11/2025	C. DA COSTA	T. DRUJON	S. BESLIN	BPA	PREMIERE DIFFUSION

DATE D'APPLICABILITE: 04/11/2025	LIBELLE: PLAN DE CONVOI REM MHD 20L3F GENERATEUR DE VAPEUR		ECHELLE: SANS
DATE DE REEXAMEN: 04/11/2035			FORMAT: A3
REF: ULM-2ML-ERQ-PLA-25-2240			
CLASSE DOCUMENTAIRE: PLAN	NUMERO DE DOSSIER: ...		PAGES: 1/1
ACCESSIBILITE: LIBRE ☐	AFFAIRE: CONVOIS PEJORATIFS EPR 2 PENLY	EDF ☒ RESTREINTE ☐ CONFIDENTIELLE ☐	COPYRIGHT EDF 2015

CONVOI SPMT 20L4F + PONT POLAIRE (POUTRE A)	
Masse Remorque à vide	~176 000 kg
Masse transportée	~154 000 kg
Poids total remorque	330 000 kg
Charge Ligne d'essieux (Kg/L.E)	16 500 kg/L.E
Charge Linéique (kgkg/m)	15 714 kg/m
Charge Surfacique (kg/m²)	2 948 kg/m²

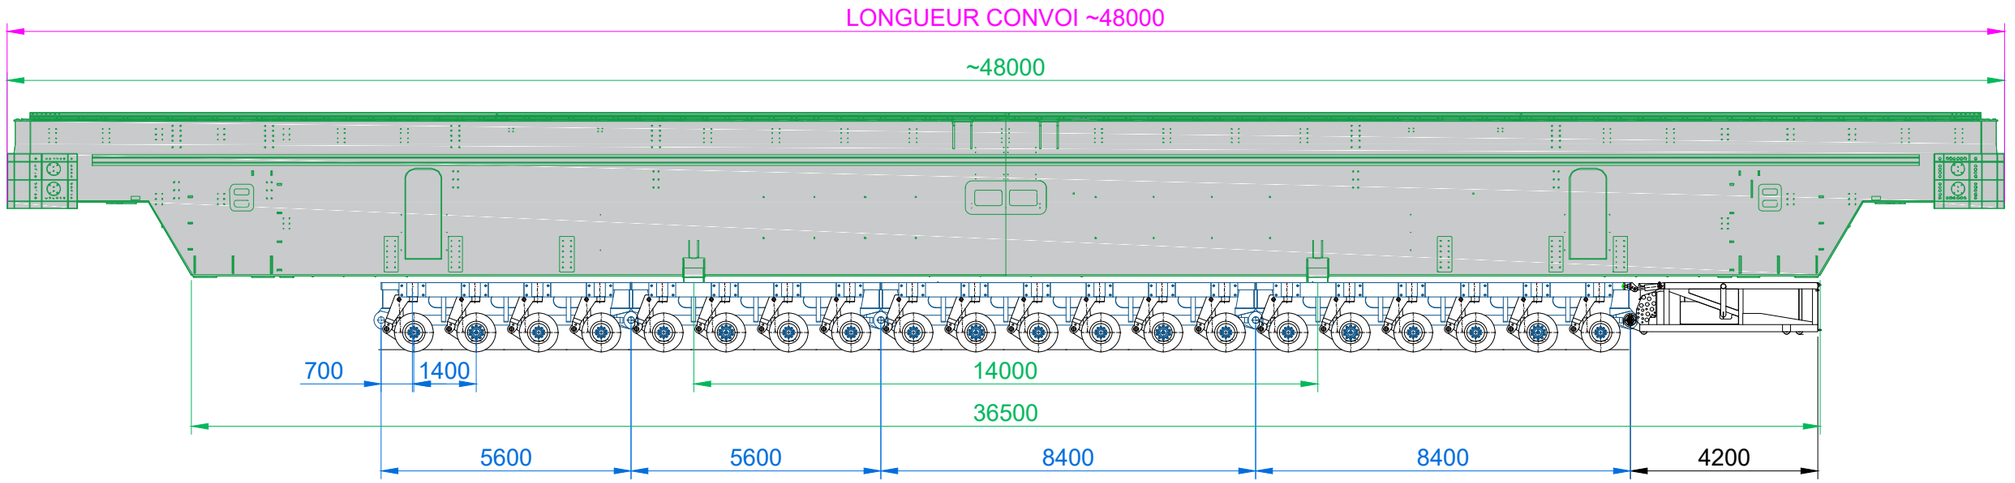

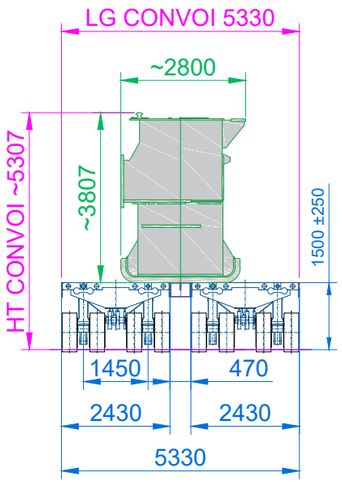

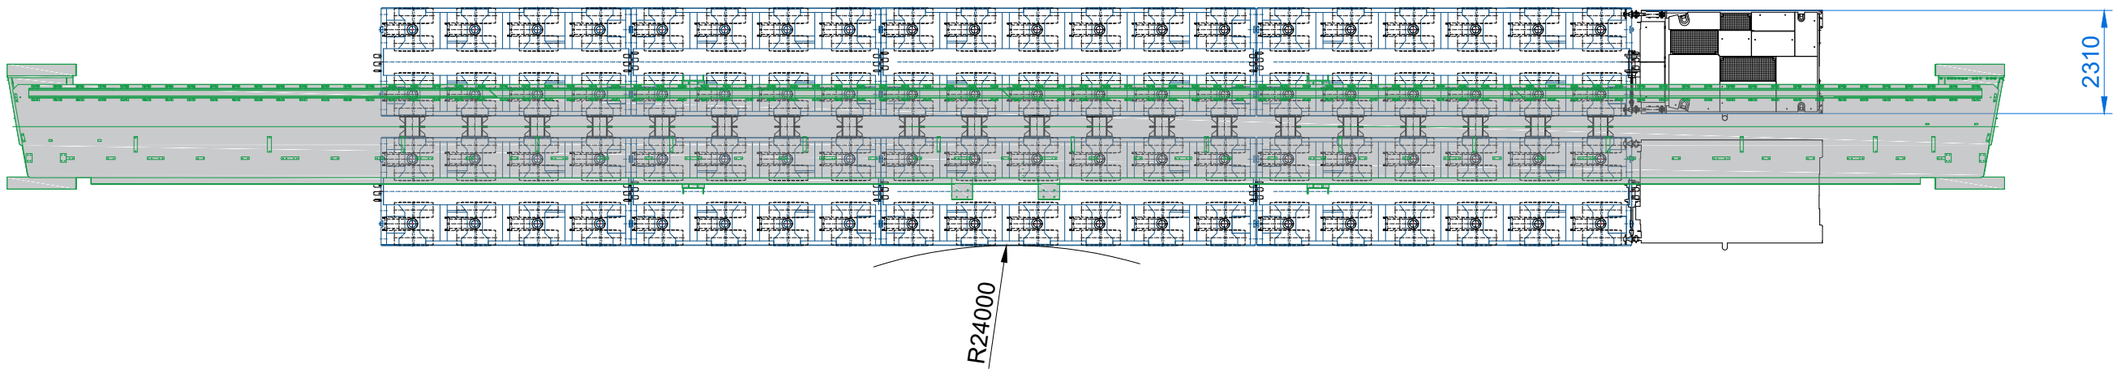

eDF

DPNT - DAIP - ULM
ALN St LEU
Zone Industrielle du Renoir
8 rue Marcel Paul
60340 St LEU d'ESSERENT

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:

Agence Logistique Nationale
Téléphone: 03 44 29 58 00
Télécopie: 03 44 29 58 09

IND	DATE	AUTEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEUR	ETAT	MODIFICATIONS - OBSERVATIONS
01	14/11/2025	C. DA COSTA	T. DRUJON	S. BESLIN	BPA	PREMIERE DIFFUSION

DATE D'APPLICABILITE: 14/11/2025

DATE DE REEXAMEN: 14/11/2035

REF: ULM-2ML-ERQ-PLA-25-2241

CLASSE DOCUMENTAIRE: PLAN

LIBELLE: PLAN DE CONVOI REMORQUE AUTOMOTRICE 20L4F PONT POLAIRE (POUTRE A)

NUMERO DE DOSSIER: ...

AFFAIRE: CONVOIS PEJORATIFS EPR 2 PENLY

ECHELLE: SANS

FORMAT: A3

PAGES: 1/1


ACCESSIBILITE: LIBRE ☐ EDF ☒ RESTREINTE ☐ CONFIDENTIELLE ☐


COPYRIGHT EDF 2015


Tracteur 8 X 6 X 4 sans Grue	
Masse	42.04 t
Charge e1 (RS):	8.634 t
Charge e2 (RS):	7.712 t
Charge e3 (RJ):	12.847 t
Charge e4 (RJ):	12.847 t

CONVOI 12L3F MHD + 1Tracteur et 1 pousseur + Convoi Gabarit EPR 2	
Masse Remorque à vide	70 000 kg
Masse transportée	110 000 kg
Poids total remorque	180 000 kg
Charge Ligne d'essieux (Kg/L.E)	15 000 kg/L.E
Charge Linéique (kg/m)	10 533 kg/m
Charge Surfacique (kg/m²)	2 163 kg/m²
POIDS TOTAL REMORQUE + 3 TRACTEURS	264 080 kg

Remorque MHD 12L3F à vide	
Masse	70 000 kg
LONGUEUR	18.6 m
LARGEUR	4.87 m
Charge Ligne d'essieux (kg/L.E)	5883 kg/LE
Charge Linéique (kg/m)	4096 kg/m
Charge Surfacique (kg/m²)	820 kg/m²

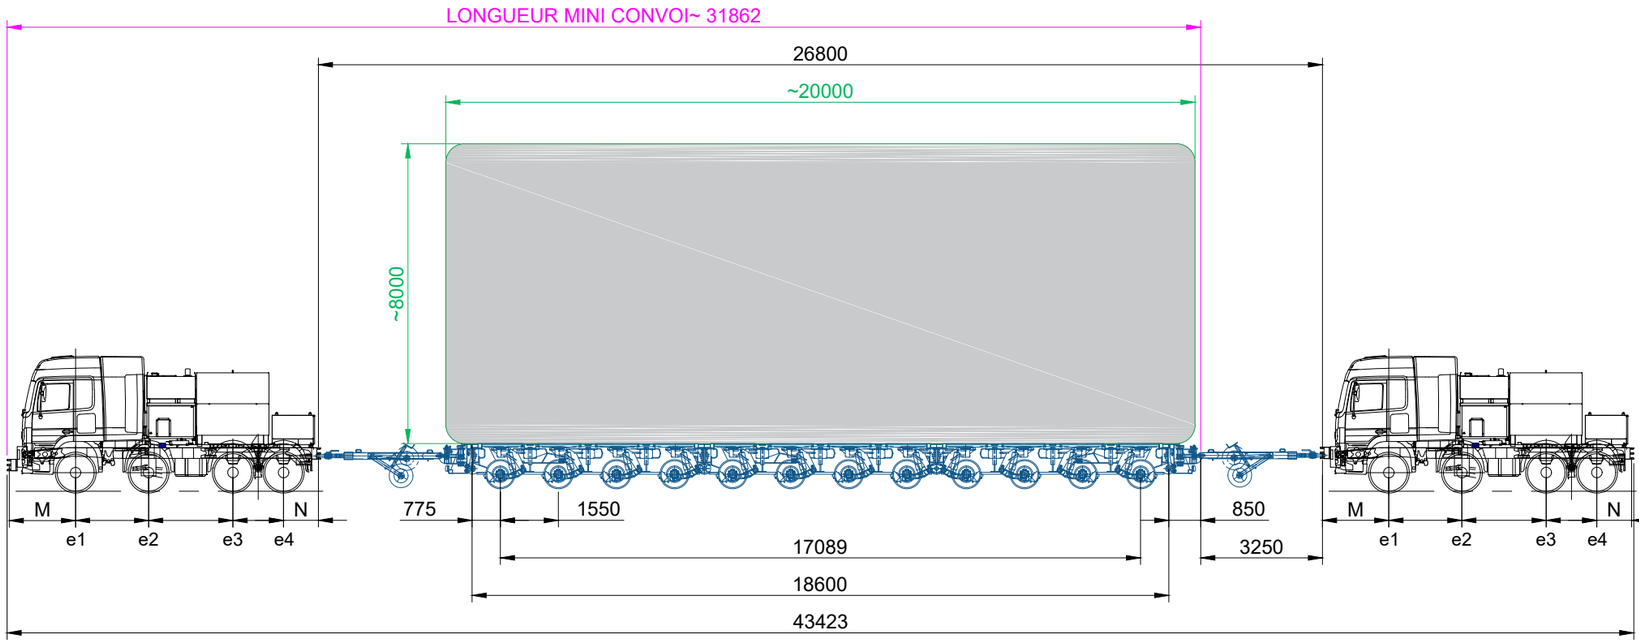

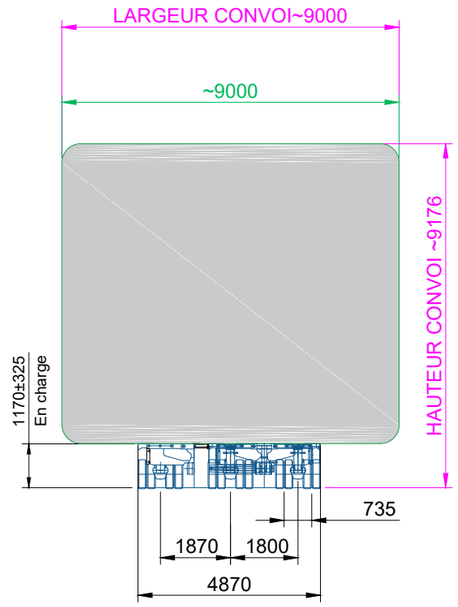

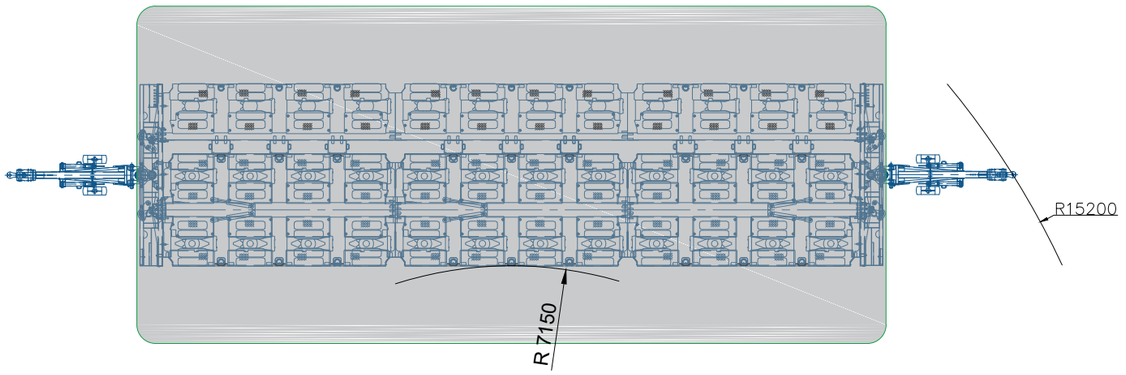

DPNT - DAIP - ULM
ALN St LEU
Zone Industrielle du Renoir
8 rue Marcel Paul
60340 St LEU d'ESSERENT

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:

Agence Logistique Nationale
Téléphone: 03 44 29 58 00
Télécopie: 03 44 29 58 09

IND	DATE	AUTEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEUR	ETAT	MODIFICATIONS - OBSERVATIONS
01	15/11/2025	C. DA COSTA	T. DRUJON	S. BESLIN	BPA	PREMIERE DIFFUSION

DATE D'APPLICABILITE: 15/11/2025

DATE DE REEXAMEN: 15/11/2035

REF: ULM-2ML-ERQ-PLA-25-2320

CLASSE DOCUMENTAIRE: PLAN

LIBELLE:

PLAN DE CONVOI
REM MHD 12L3F
GABARIT COLIS (HORS GV ET P.POLAIRE)

NUMERO DE DOSSIER: ...

AFFAIRE: CONVOIS PEJORATIFS EPR 2 PENLY

ECHELLE: SANS

FORMAT: A3

PAGES: 1/1

ACCESSIBILITE: LIBRE ☐ EDF ☒ RESTREINTE ☐ CONFIDENTIELLE ☐

COPYRIGHT EDF 2015
